




STEEK ENERGIE IN EIGEN MOLENS



4 okt De Klif
20h17

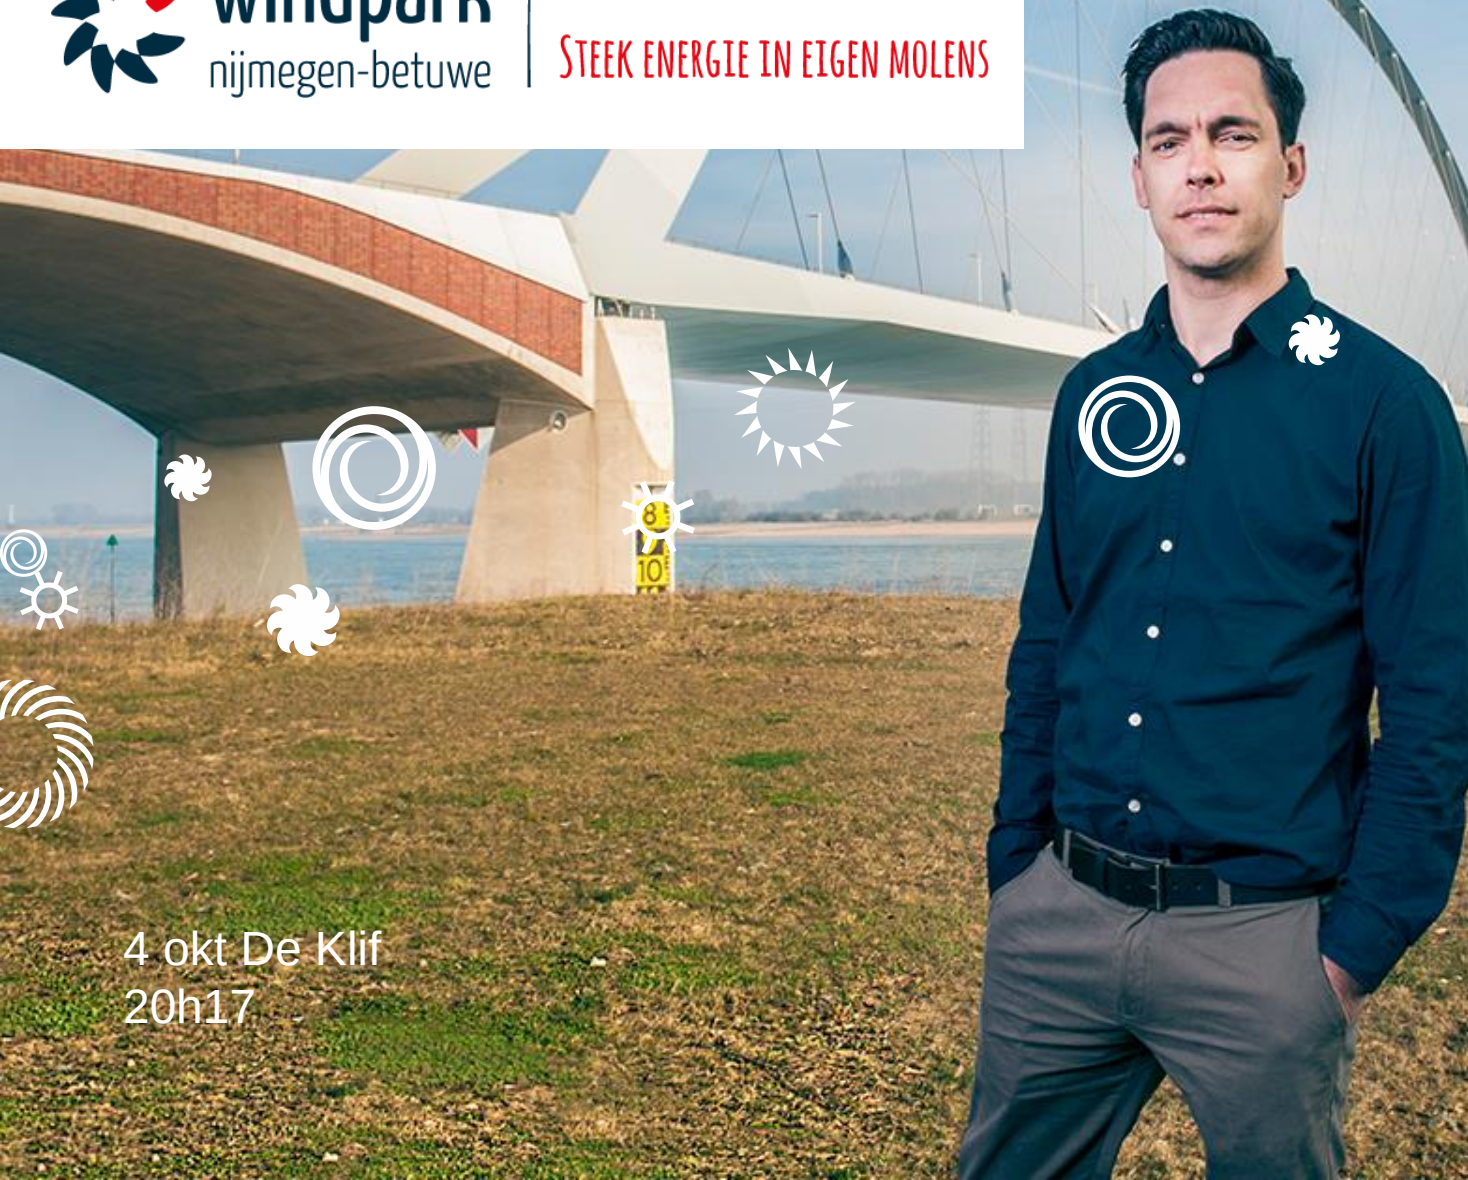

Stand van zaken

WAT IS ER GEBEURD SINDS 7 APRIL

De Grift 25 februari
16h12



windpark
nijmegen-betuwe

STEEL ENERGIE IN EIGEN MOLENS

De Grift 7 april 2016
12h22



Mijlpaal 2
€214.560

De Grift 28 april
12h15



Mijlpaal 3
€321.000

De Grift 18 juni
14h09



Mijlpaal 4
€1.609.200

Afrit-38 11 aug
04h22



Mijlpaal 5
€536.400

Antwerpen 18 aug
19h35



Mijlpaal 6
€536.400

De Grift 16 september
12h30



Mijlpaal 7
€3.696.200



MAAR OOK

A photograph of a construction site. Two workers wearing bright yellow rain suits are digging a trench in a grassy area. One worker is using a shovel. To the left, there is a paved road and several red and white striped traffic barriers. In the background, a small excavator is visible. The scene is outdoors with trees and buildings in the distance.

Griftdijk 12 juni
12h43

Netinpassing
€365.188

Griftdijk 27 juli
10h18



Aanpassing
schakelstation

Voor hetzelfde geld



Bijna klaar – maar nog niet helemaal

DE KOMENDE PERIODE

De Grift
Half november



Mijlpaal 8
Overname
turbines

De Grift
8 tot en met 10 dec



Openings
weekend

De Grift
Januari 2017



Mijlpaal 9
Afronding
restpunten



windpark
nijmegen-betuwe

STEEL ENERGIE IN EIGEN MOLENS



Tegenslag in 4 bedrijven

WAT KWAMEN WE NOG MEER TEGEN

Shanghai 19 mei
9h42



Bladschade transport

Vertraging turbine 5

Mussenhut 11 juli
11h11



Aanpassing bouwplan

- Vertraging

De Grift 29 juni
13h01



Hoog water in juni

- Vertraging
- Meerwerk

De Grift 11 juli
20h44



Kabeldiefstal

- Vertraging
- Meerwerk

Al met al


Bijna klaar

- Oplevering 2^{de} helft november

Op koers

- SDE start op 1 november
- Overname turbines 2^{de} helft november


Binnen budget

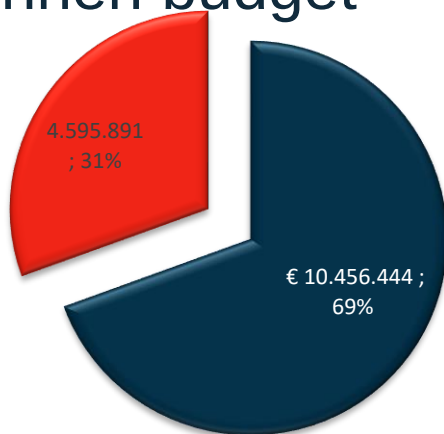



LAATSTE LOODJES

Wat nog te doen

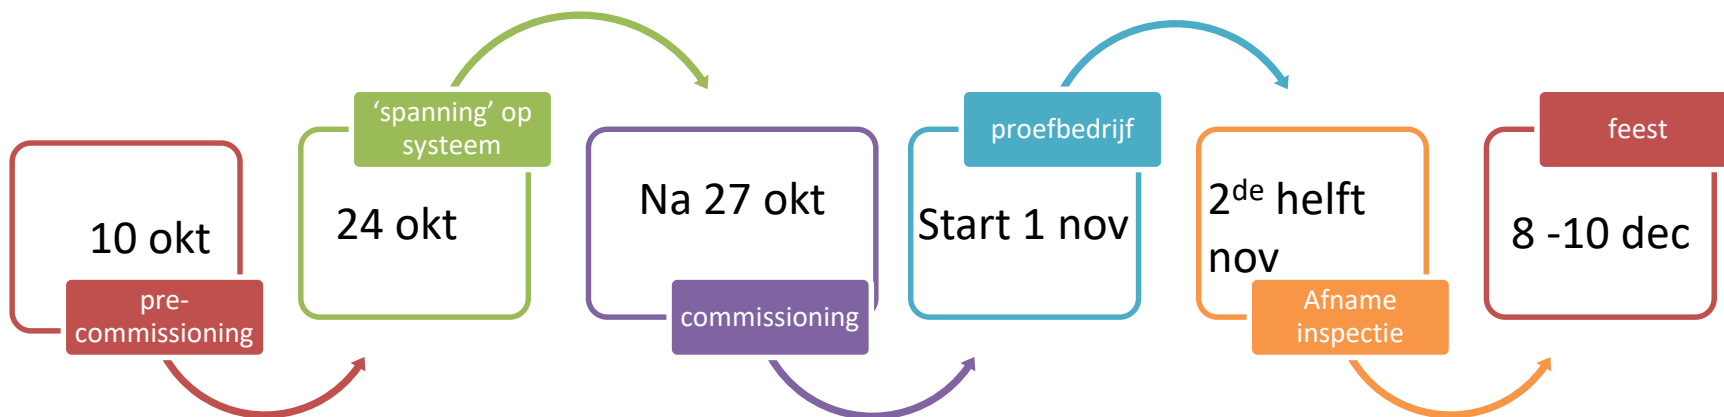



WINDPARKNIJMEGENBETUWE.NL



STEEK ENERGIE IN EIGEN MOLENS
